



PJM Project Review - Demo-Projekt

Stichtag (Auswertungstag)	2026-10-02	Zusätzlich geschlossen	48	Cancelled	0
Überwachte Aufgaben	95	Erfüllungsgrad	51.6 %	Fachabteilungen	13
davon Aufgaben (>0 Tage)	95	Überfällig (offen)	45	Snapshots im Vergleich	6
davon Meilensteine (0 Tage)	0	Verspätet geschlossen	35		
Geplant geschlossen	93	Hold	2		


Master Timeline - Demo-Projekt

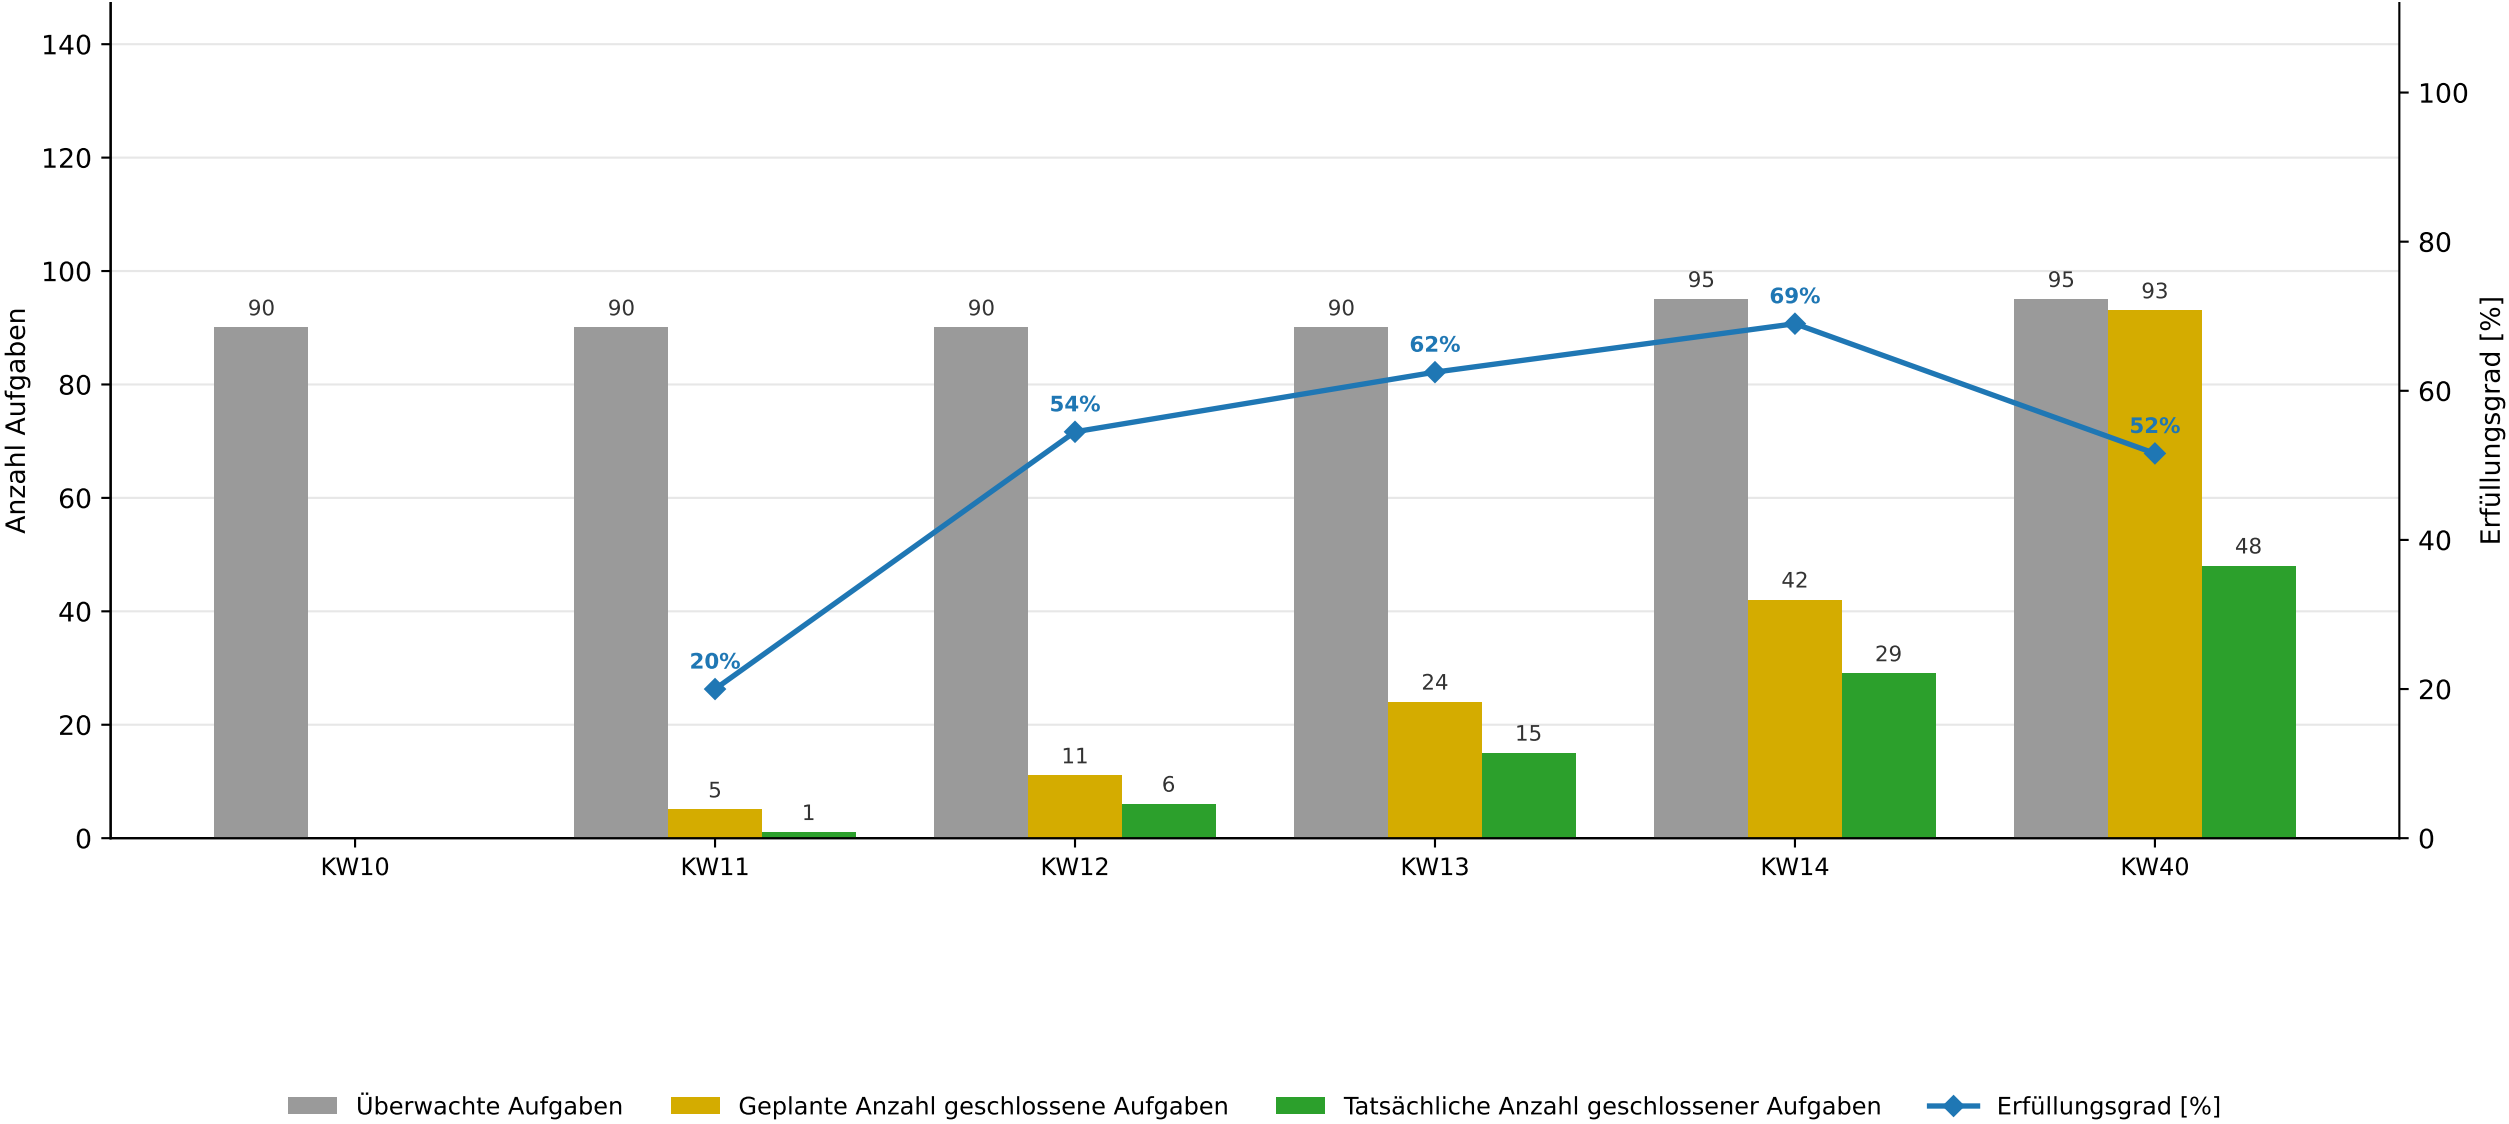


Verschiebung des erwarteten Projektendes - Demo-Projekt

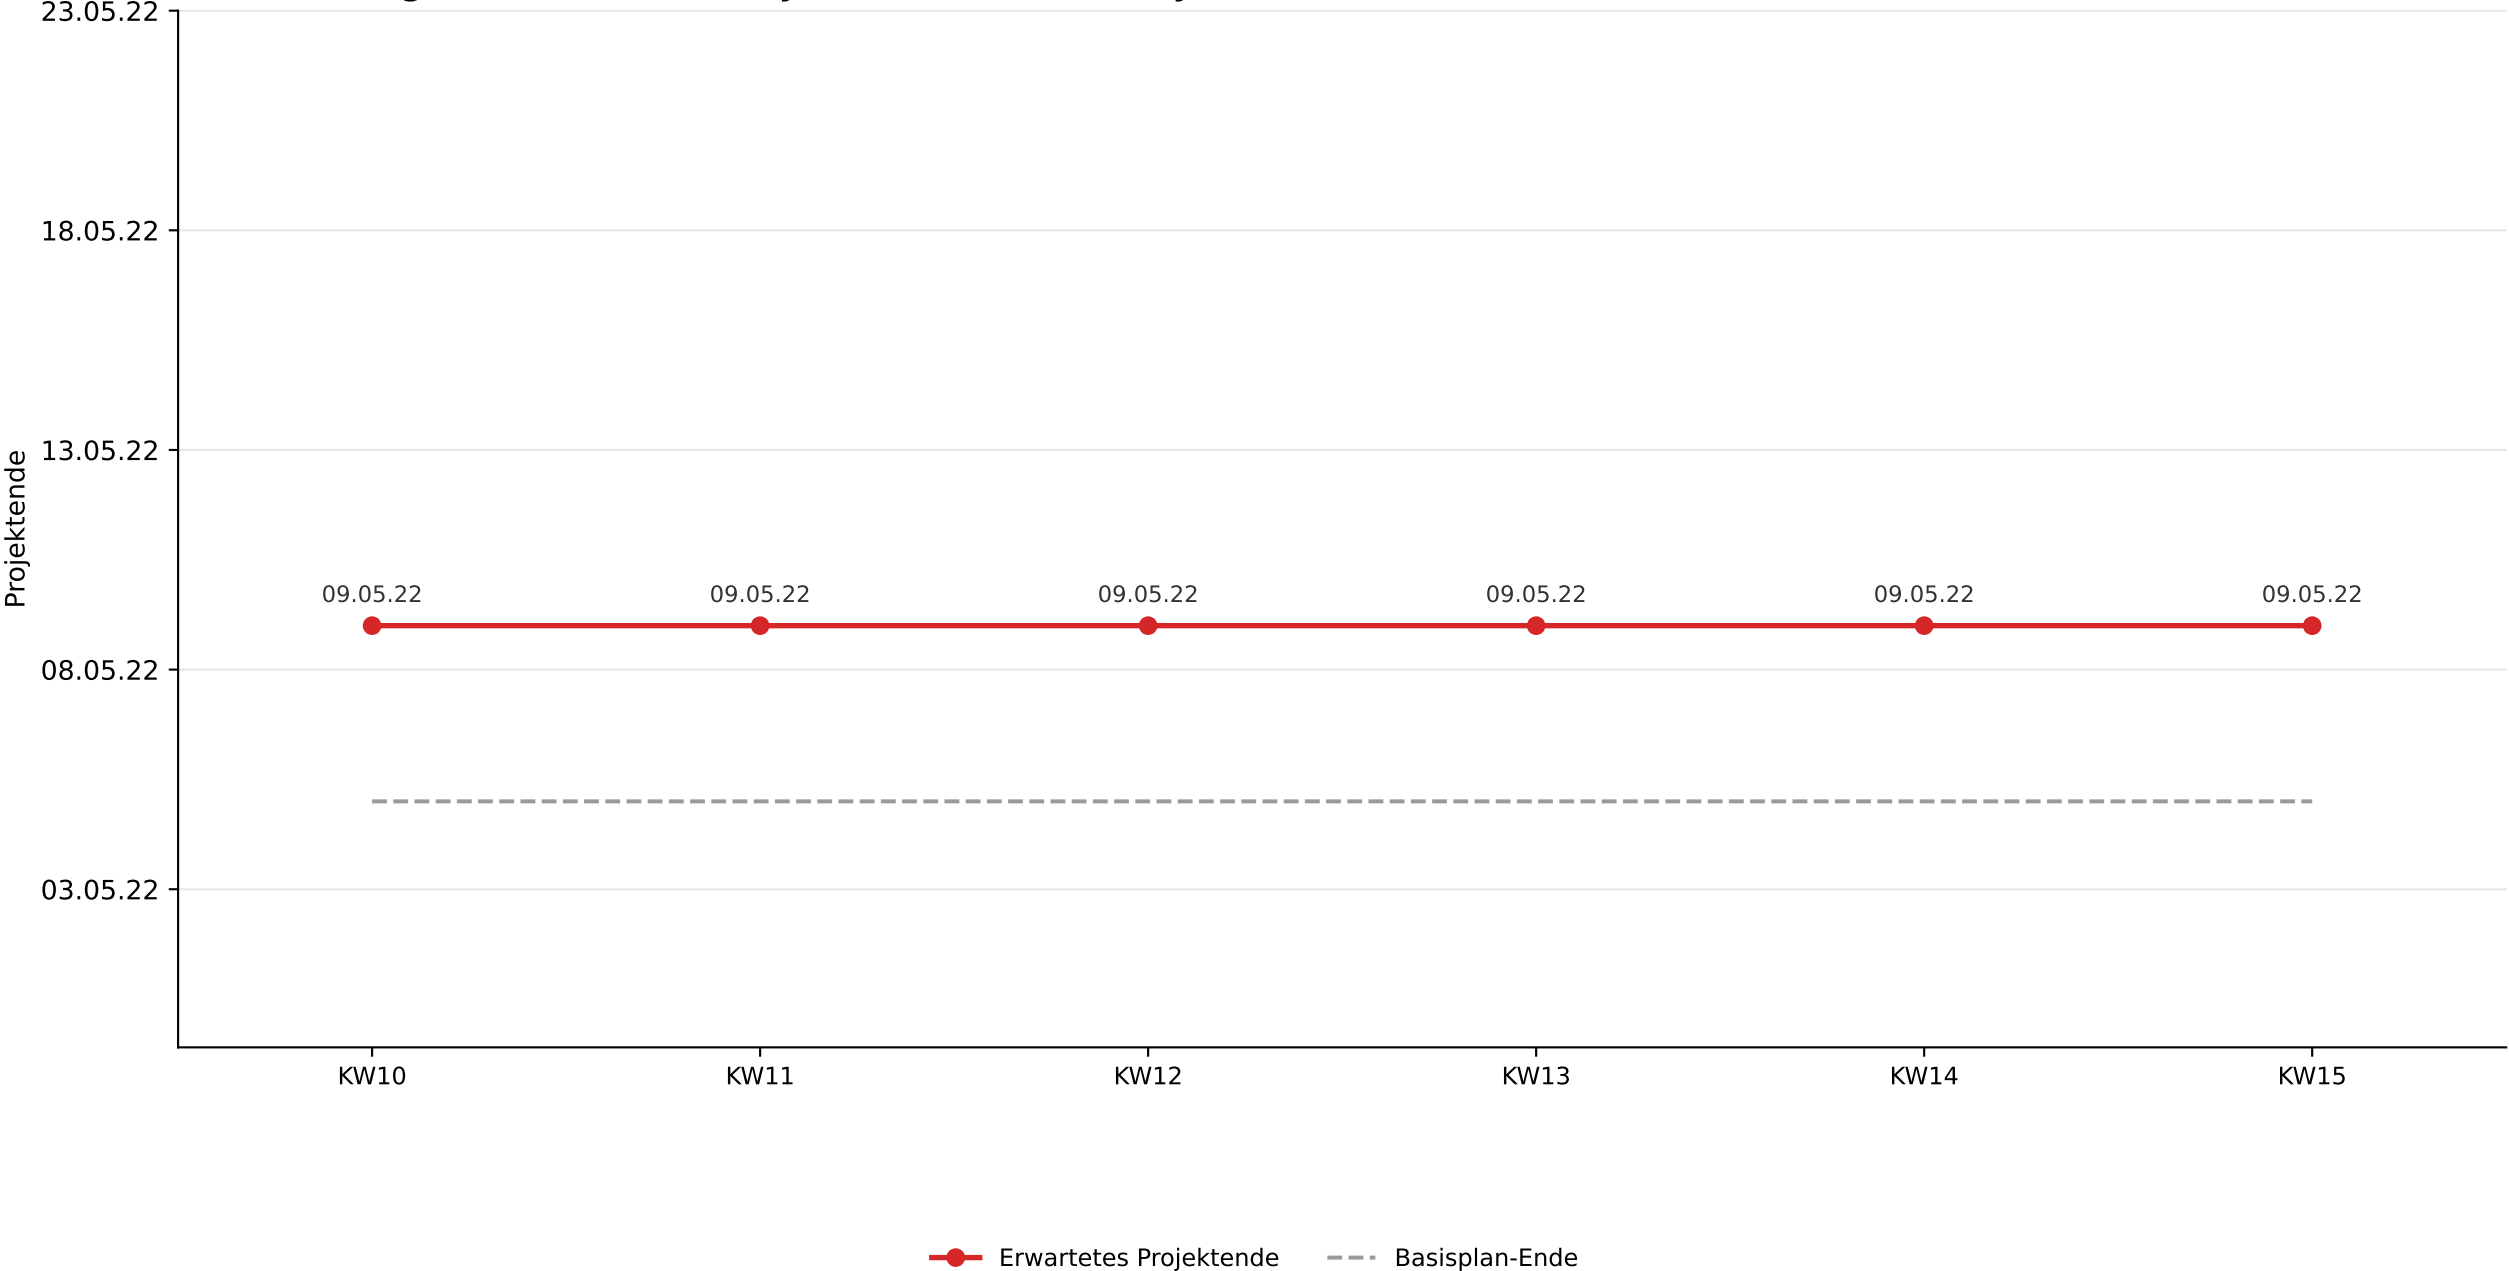

Aufgaben je Fachabteilung - Stand 2026-10-02

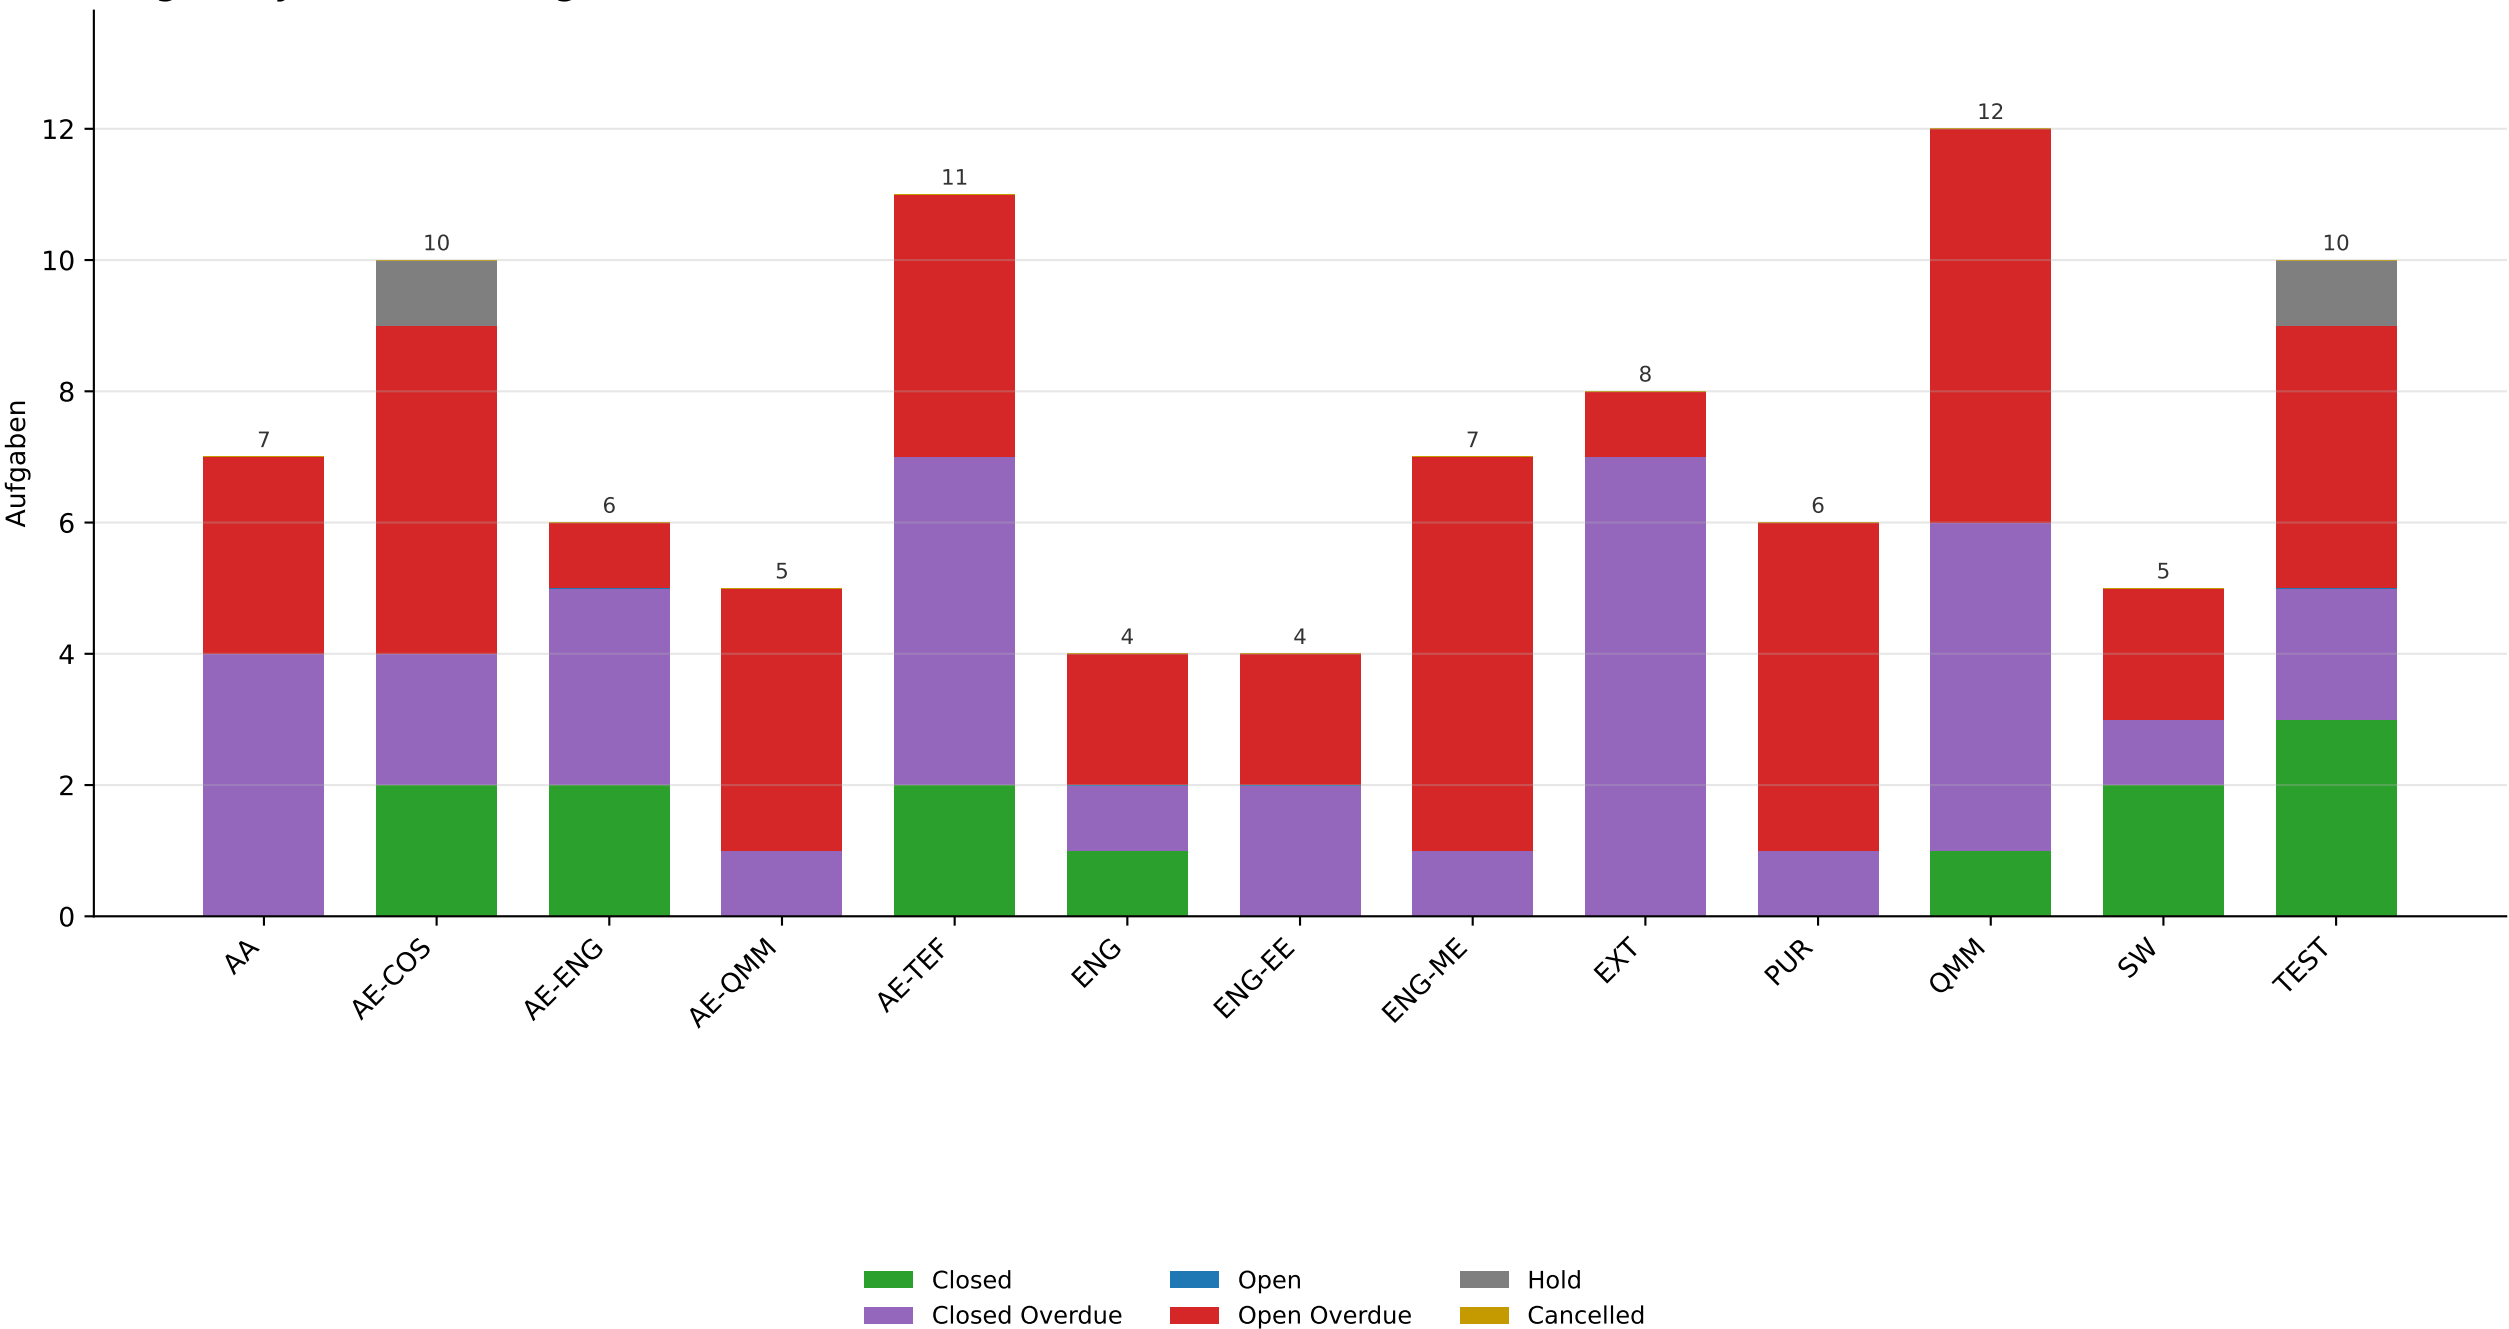

Überfällige Aufgaben je Fachabteilung

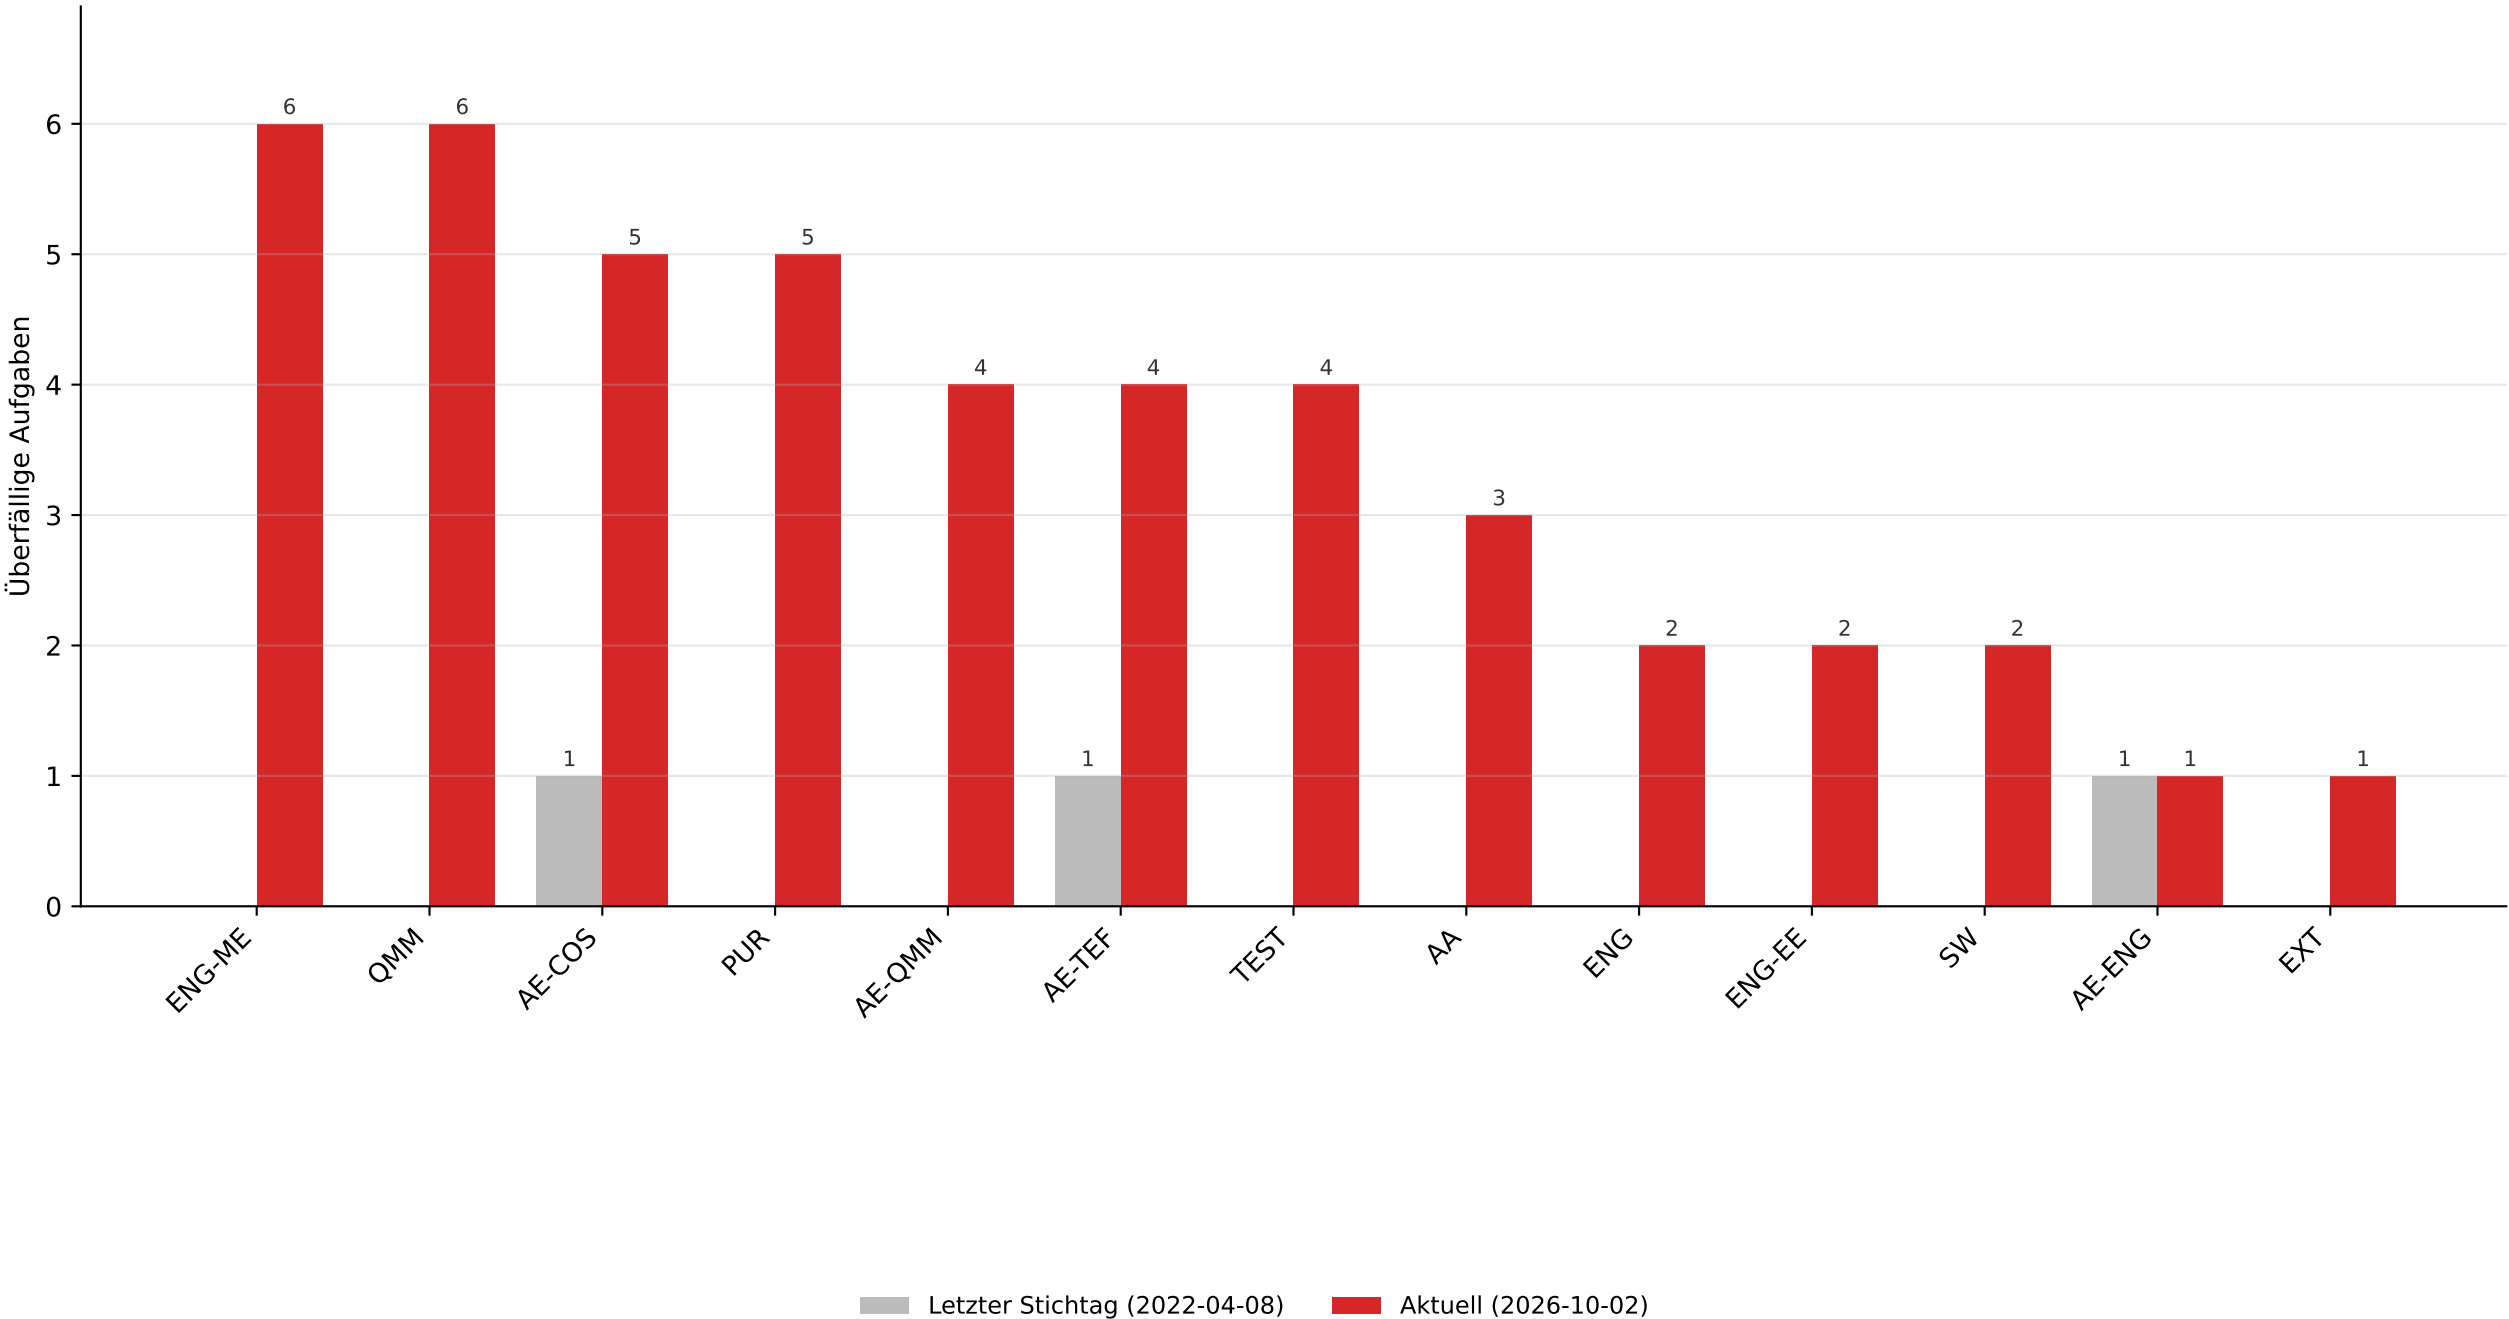

Top-5 Overdues mit Trendanalyse - 2022-04-08 vs. 2026-10-02

Fachabteilung	2022-04-08	2026-10-02	Trend	Verlauf
ENG-ME	0	6	▲ +6	
QMM	0	6	▲ +6	
AE-COS	1	5	▲ +4	
PUR	0	5	▲ +5	
AE-TEF	1	4	▲ +3	

Überfällige Aufgaben - 2026-10-02 (45)

Abteilung	Aufgabe	Geplantes Ende	Verzug	Fortschritt
AE-COS	AE-COS Aufgabe 003	2022-03-30	1647 d	95 %
AA	AA Aufgabe 075	2022-04-11	1635 d	95 %
ENG	ENG Aufgabe 063	2022-04-12	1634 d	95 %
TEST	TEST Aufgabe 024	2022-04-12	1634 d	95 %
ENG-EE	ENG-EE Aufgabe 012	2022-04-13	1633 d	95 %
QMM	QMM Aufgabe 015	2022-04-13	1633 d	95 %
TEST	TEST Aufgabe 078	2022-04-13	1633 d	95 %
AE-COS	AE-COS Aufgabe 082	2022-04-14	1632 d	95 %
AE-QMM	AE-QMM Aufgabe 046	2022-04-17	1629 d	50 %
TEST	TEST Aufgabe 041	2022-04-17	1629 d	83 %
AE-TEF	AE-TEF Aufgabe 037	2022-04-18	1628 d	77 %
PUR	PUR Nachtrag 5	2022-04-18	1628 d	50 %
SW	SW Aufgabe 026	2022-04-18	1628 d	73 %
AE-QMM	AE-QMM Aufgabe 028	2022-04-19	1627 d	56 %
TEST	TEST Aufgabe 052	2022-04-20	1626 d	55 %
AE-COS	AE-COS Nachtrag 1	2022-04-21	1625 d	33 %
EXT	EXT Aufgabe 090	2022-04-21	1625 d	62 %
QMM	QMM Aufgabe 020	2022-04-21	1625 d	45 %
