



PJM Project Review - Demo-Projekt

Stichtag	2022-04-15	Überfällig (offen)	8
Überwachte Aufgaben	95	Verspätet geschlossen	35
Geplant geschlossen	63	Hold	2
Tatsächlich geschlossen	48	Fachabteilungen	13
Erfüllungsgrad	76.2 %	Snapshots im Vergleich	6


Master Timeline - Demo-Projekt

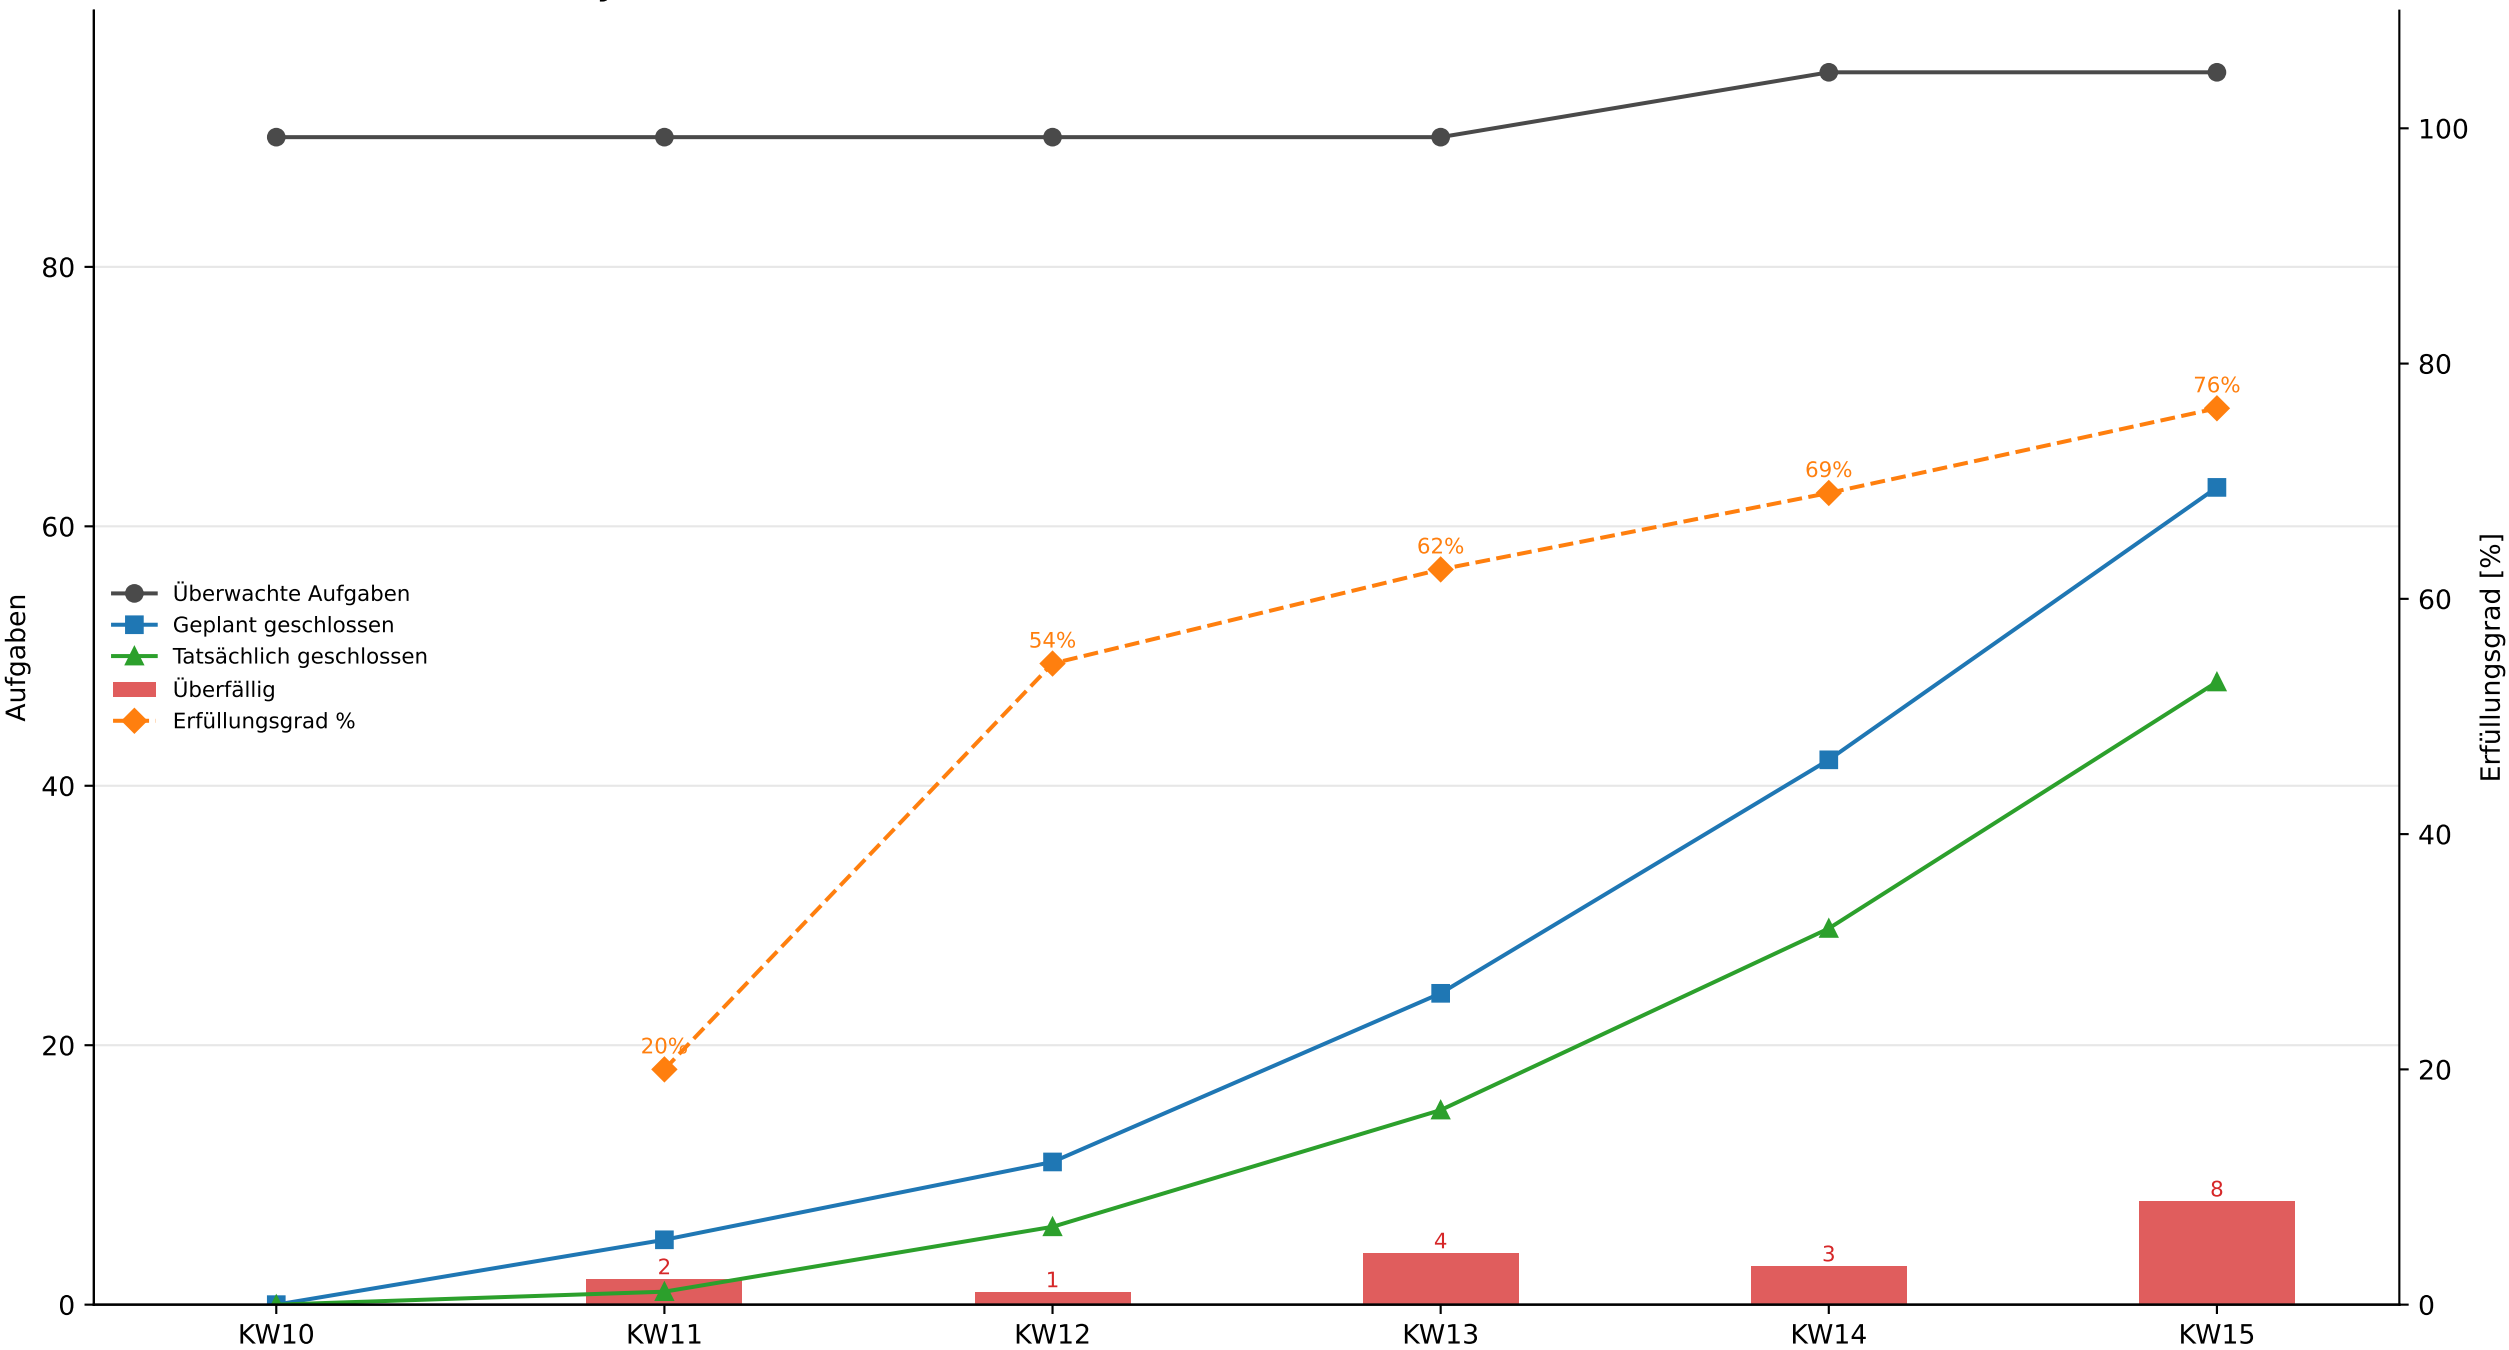

Aufgaben je Fachabteilung - KW15 2022-04-15 - Demo

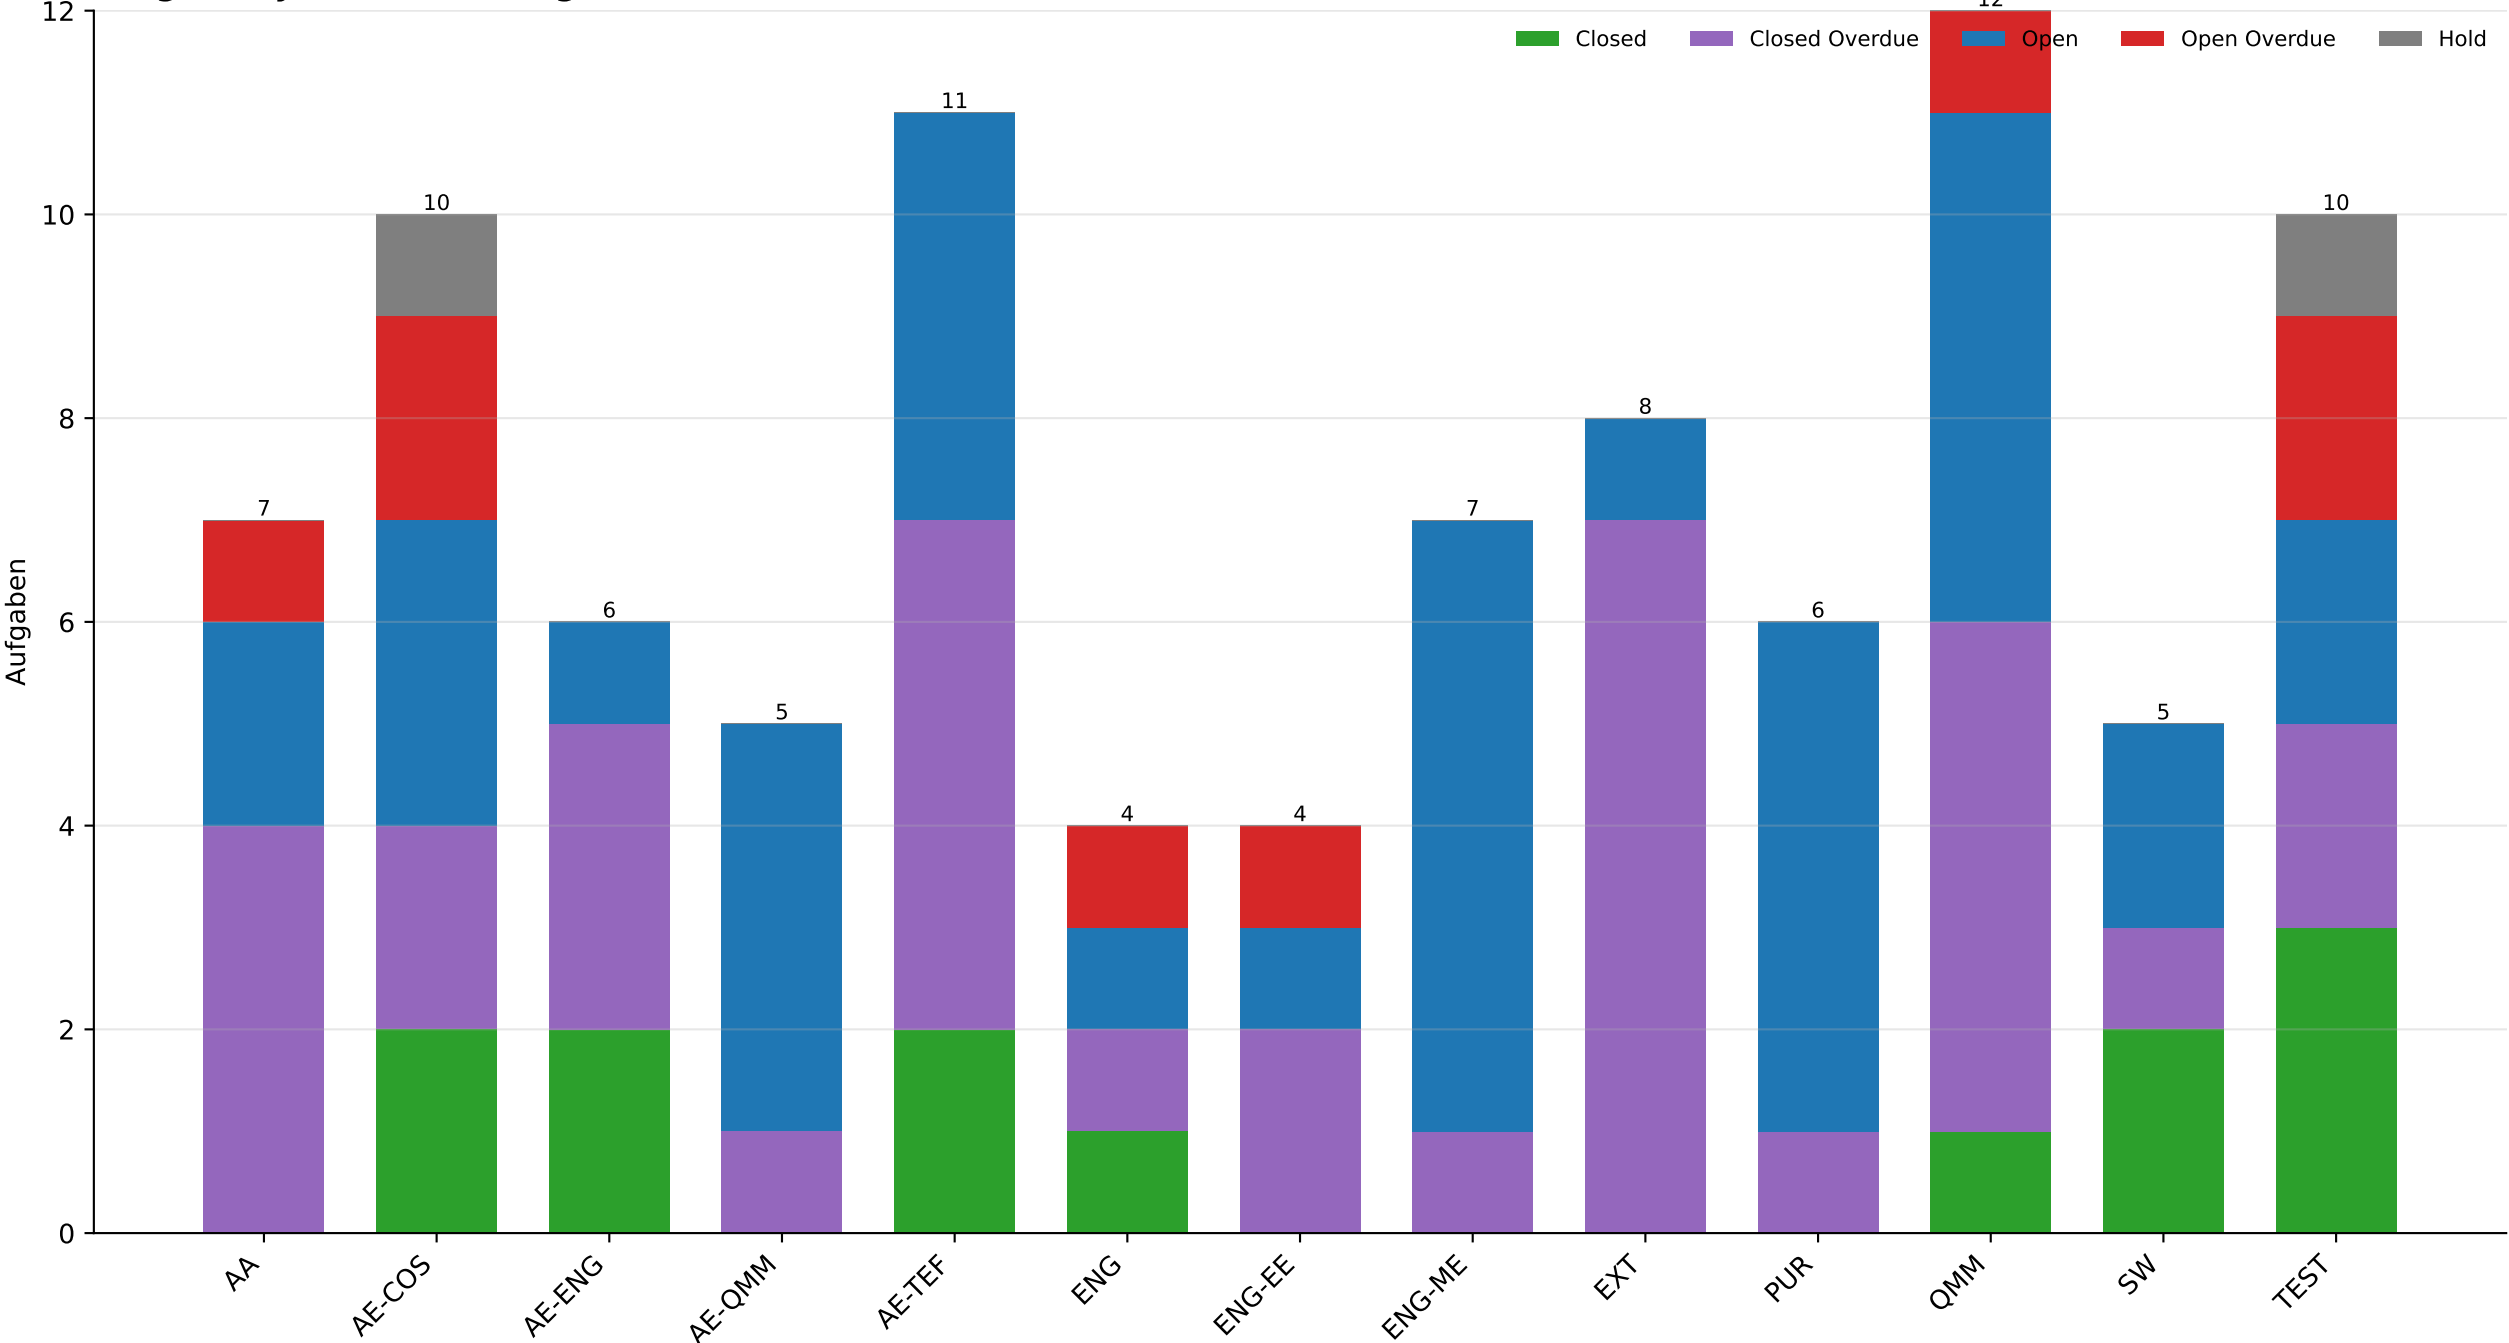

Überfällige Aufgaben je Fachabteilung

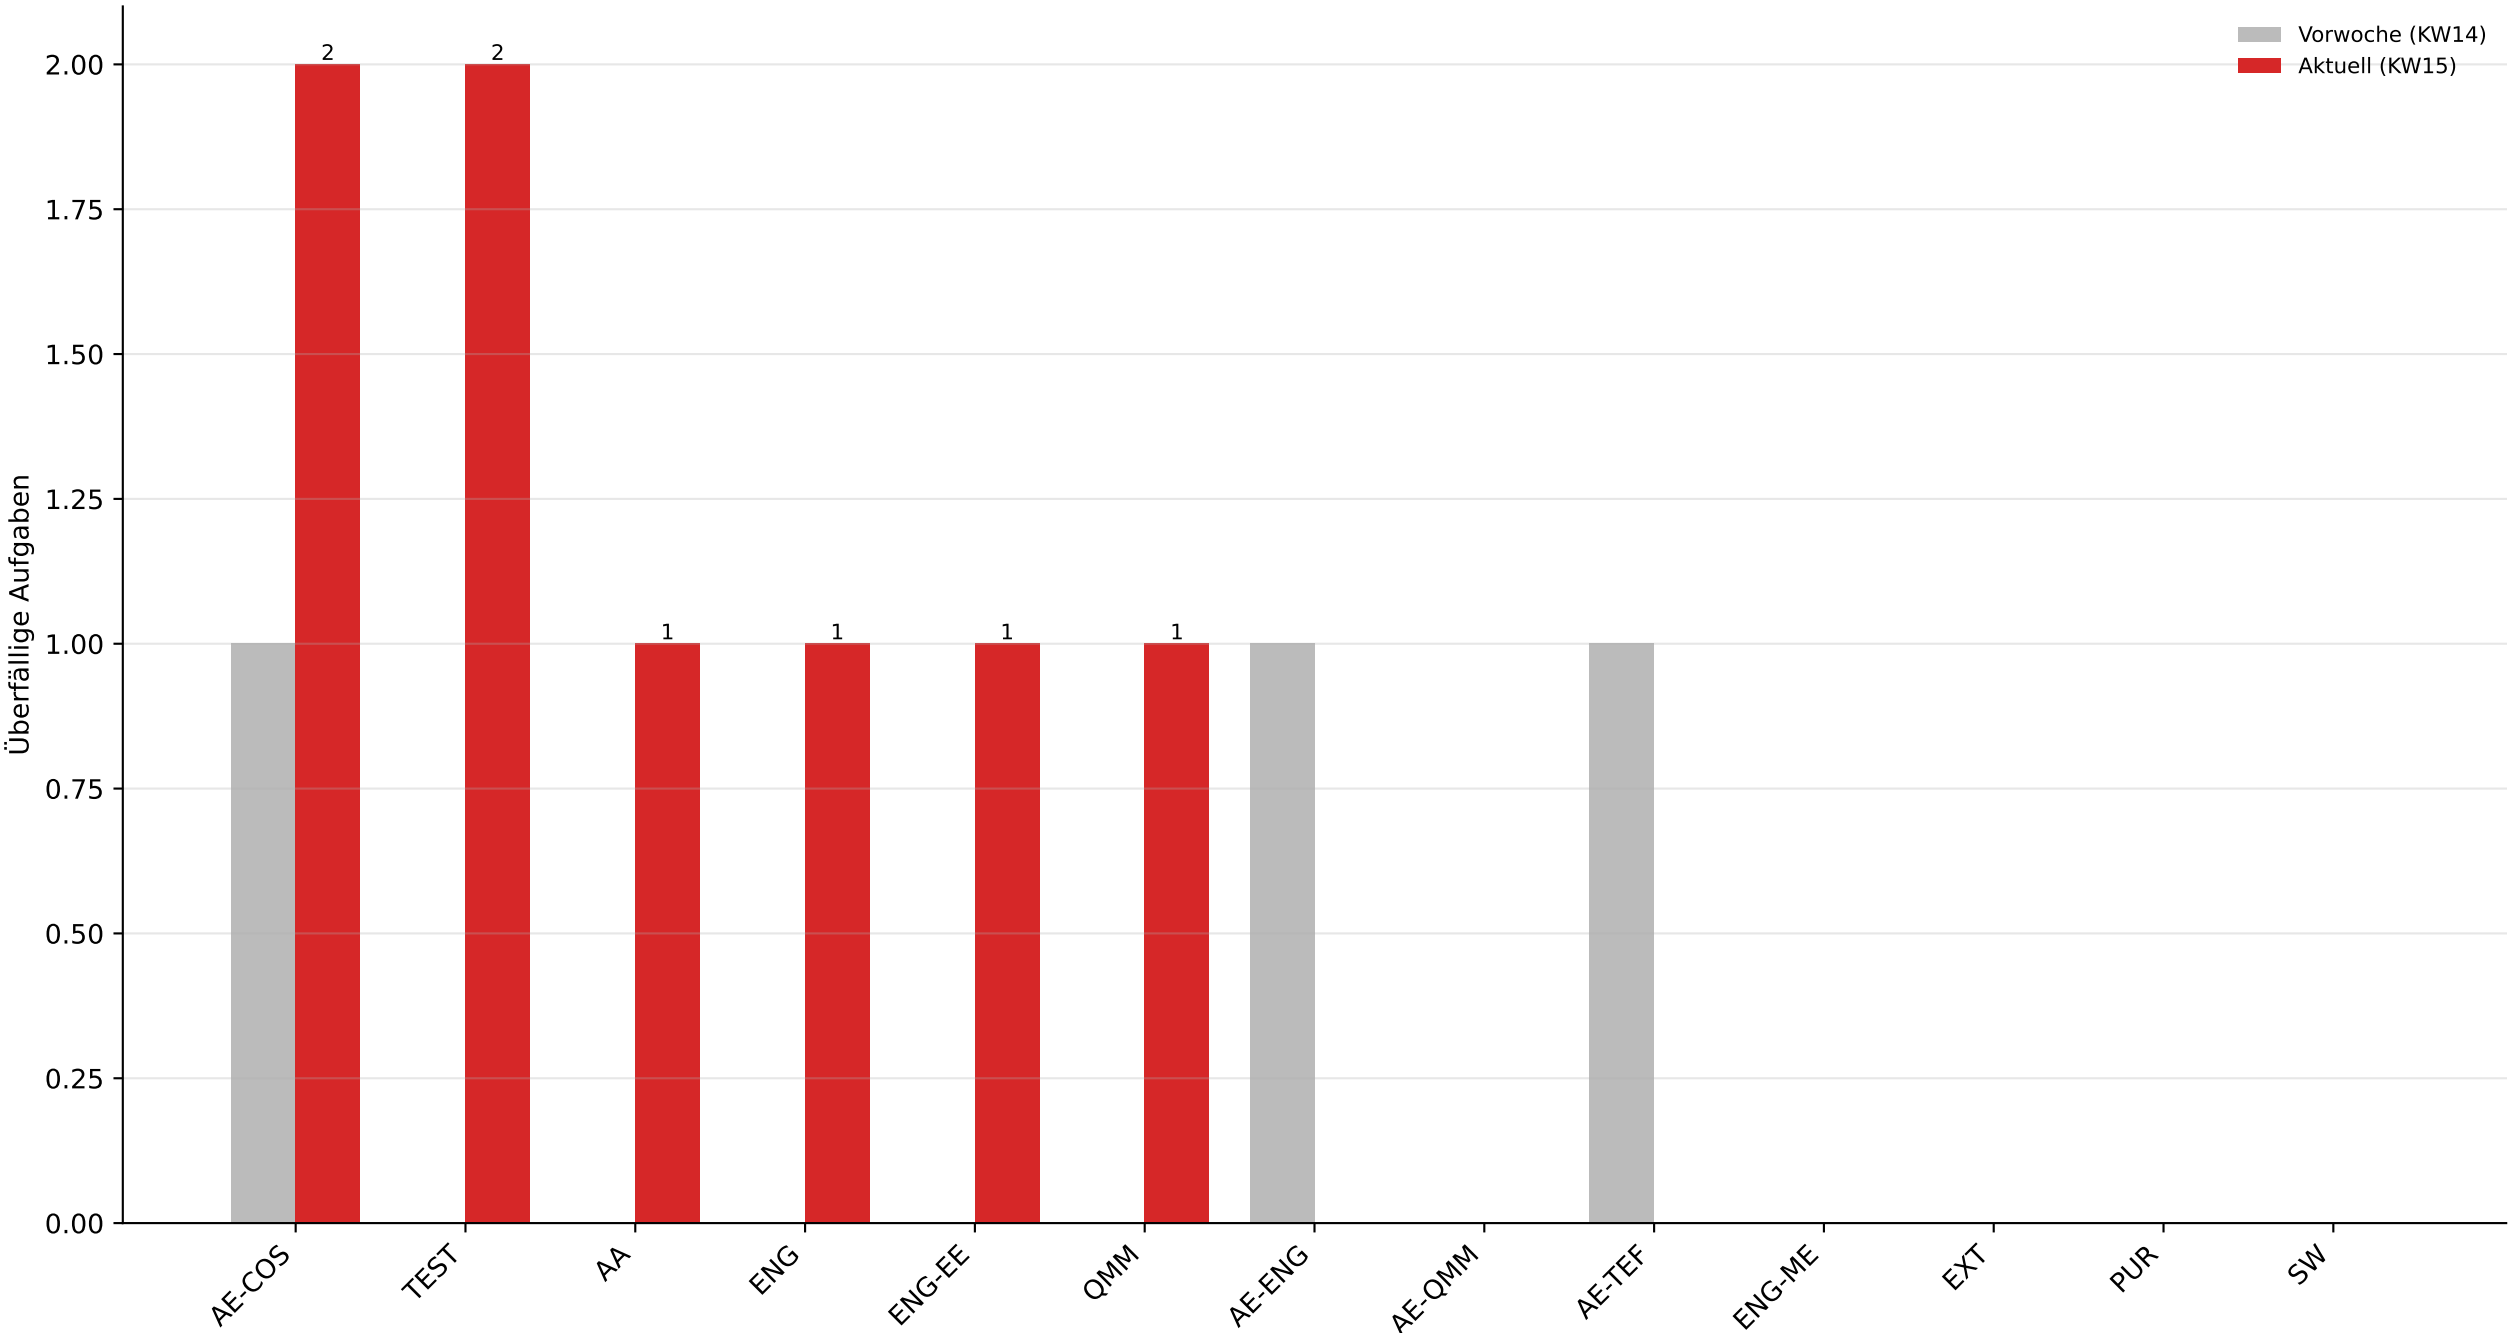

Top-5 Overdues - KW14 vs. KW15

Fachabteilung	KW14	KW15	Trend
AE-COS	1	2	▲ +1
TEST	0	2	▲ +2
AA	0	1	▲ +1
ENG	0	1	▲ +1
ENG-EE	0	1	▲ +1

Überfällige Aufgaben - KW15 (8)

Abteilung	Aufgabe	Geplantes Ende	Verzug	Fortschritt
AE-COS	AE-COS Aufgabe 003	2022-03-30	16 d	95 %
AA	AA Aufgabe 075	2022-04-11	4 d	95 %
ENG	ENG Aufgabe 063	2022-04-12	3 d	95 %
TEST	TEST Aufgabe 024	2022-04-12	3 d	95 %
ENG-EE	ENG-EE Aufgabe 012	2022-04-13	2 d	95 %
QMM	QMM Aufgabe 015	2022-04-13	2 d	95 %
TEST	TEST Aufgabe 078	2022-04-13	2 d	95 %
AE-COS	AE-COS Aufgabe 082	2022-04-14	1 d	95 %
